


INFRAESTRUTURA – COMPLEMENTO

Informativo 61 – Prestação de Contas

A construção de um novo prédio com salas de aula e laboratórios, inicialmente próximo ao campo de futebol, previa necessariamente a demolição do prédio onde funciona a sala de musculação. Além disso, a empresa se recusava a iniciar as obras alegando questões orçamentárias. Esta obra só teve início depois de várias reuniões entre a atual direção e os representantes da empresa e a recomendação do procurador federal junto ao IFRJ de multá-la, caso ela não iniciasse a obra imediatamente. Enquanto isso, colocamos em discussão a possibilidade de alteração de alocação desse novo prédio de salas de aula e laboratórios. Analisando o Plano Diretor, verificamos que previa-se a construção de novos prédios onde era a Laboratório de Olericultura, além de ser esse local mais adequado para tal instalação. Depois de algumas reuniões do Colegiado de Campus, em que foram apresentados os pontos positivos e negativos da área proposta, inclusive pelas equipes de engenharias do CPIN, o CoCam aprovou, por unanimidade, a construção do novo prédio na entrada do Campus, próximo ao Laboratório de Suinocultura, assim como a transferência do Laboratório de Olericultura para a mesma área onde funciona o Laboratório de Fruticultura (mudança já prevista desde a gestão anterior). Apesar de estar atrasada, empresa prevê a entrega do novo prédio para julho de 2019. Havia, ainda, duas obras que se encontravam paralisadas: o novo prédio do NEAD e o novo prédio do Restaurante Institucional. Estas duas construções eram de responsabilidade de uma mesma empresa e, depois de algumas reuniões com os seus representantes, a empresa retornou com a construção do novo Restaurante Institucional por alguns meses, vindo a abandoná-la de vez. A empresa está sendo processada por recomendação da PROJU. Entretanto, é necessário buscarmos novos recursos para o término dessas obras e licitá-las novamente.

O maior desafio encontrado por esta gestão foi o de equilibrar o orçamento e custeio do CPIN, pois o Campus tinha direito oficialmente ao orçamento que correspondia a metade do seu custeio, e a outra metade vinha transferida de outros *Campi* do IFRJ para o nosso no final do ano. Assim, solicitamos ao Pró-Reitor de Administração do IFRJ que disponibilizasse a Matriz CONIF – a planilha de redistribuição do orçamento para todos os IFs e seus respectivos Campi – e, ainda em 2014, analisamos essa planilha e identificamos o que poderíamos (ou deveríamos) fazer para diminuir esse desequilíbrio no orçamento/custeio. Identificamos que deveríamos aumentar consideravelmente o número de alunos, e que havia a demanda para tal. Decidimos ofertar novos cursos técnicos e cursos de graduação e pós-graduação. Em seguida, a Direção de Ensino fez várias reuniões para identificar essas possibilidades, as quais se transformaram em realidade com a criação do Curso Técnico em Agroindústria Integrado (2016), Curso de Licenciatura em Computação (graduação/2017), Curso de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional e Sustentabilidade (Especialização/2018), Curso Técnico em Paisagismo/Concomitante (2018). O Curso Técnico em Administração foi implantado em 2014, pois já tinha sido aprovado no ano anterior, e também contribuiu para a expansão. Todo esse esforço representaria um incremento no orçamento do CPIN, o que não ocorreu de fato por conta dos cortes no orçamento dos Institutos Federais depois do *Impeachment* da presidente da República e da troca de governantes.

Professor Reginaldo Ribeiro Soares

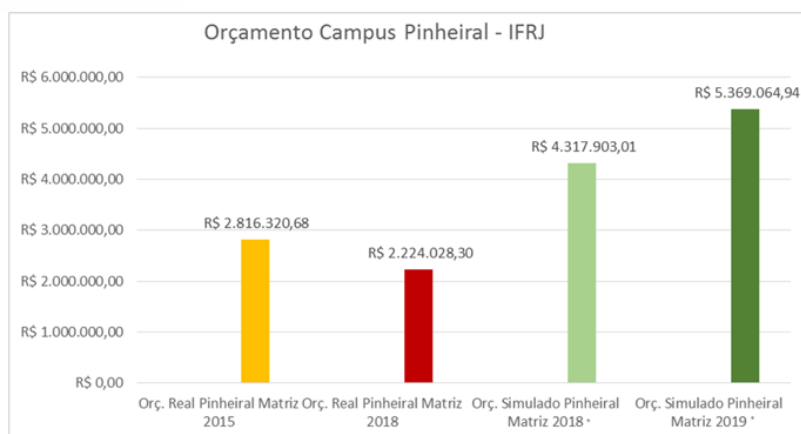

* Se não houvesse o corte SETEC/MEC.

SETOR DE ENGENHARIA - GESTÃO 2014/2018				
OBRAS	INICIO	TÉRMINO	STATUS 2018	ORÇAMENTO
Restaurante	18/02/2013	22/03/2015	paralisada	R\$ 1.336.000,00
Nead	18/02/2013	20/02/2015	paralisada	R\$ 1.910.000,00
Subestação Energia	15/04/2013	13/08/2014	concluído	R\$ 674.354,68
Adaptação Biblioteca	03/06/2013	21/10/2015	concluído	R\$ 746.000,00
Reforma Pavilhões	18/06/2013	28/06/2016	concluído	R\$ 833.364,77
Reforma da ETA	25/11/2013	18/02/2015	concluído	R\$ 172.980,00
Prédio Salas Aula	16/12/2013		em execução	R\$ 4.440.953,53
Centro Visit. EECOE	21/11/2016	16/11/2017	concluído	R\$ 148.658,38
Centro Visit. EECOE	15/01/2017	15/04/2017	concluído	R\$ 34.090,00
Lab. Panif. Vegetais	27/06/2017		em execução	R\$ 222.419,27
Lab. Anatomia Veg/Ani	abr/18		contratação	R\$ 199.057,07
SERVIÇOS				
Ponto ônibus	nov/14	fev/15	concluído	emergencial
Parede de empena CVT	mai/15	jul/15	concluído	emergencial
Telhado Refeitório	jul/15	ago/15	concluído	emergencial
Cobert p/ Equoterapia	nov/15	mar/16	concluído	emergencial
Área Estudo/Quiosques	nov/15	mai/16	concluído	emergencial
Reservatório Água	nov/15	mar/16	concluído	emergencial
Reparo Telh Apicult	nov/15	abr/16	concluído	emergencial
Adapt Porão p/ Sersa	nov/15	abr/16	concluído	emergencial
Adapt Secr Graduação	nov/16	dez/16	concluído	emergencial
Garagem Trator	nov/16	fev/17	concluído	emergencial
Base para Container	nov/16	jan/17	concluído	emergencial
Galpão Secagem Grãos	nov/17	abr/18	concluído	emergencial
Recup Telhado Suino	nov/17	mar/18	concluído	emergencial
Ref Telhado Cooperat	nov/17	mar/18	concluído	emergencial



INSTITUTO FEDERAL

Rio de Janeiro

Campus Pinheiral
